

# 宮ノ谷川砂防工事(堰堤工)のお知らせ(8月度)

吉田建設(株)

下段地域の皆様には日頃より、宮ノ谷川砂防事業へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。現場はダム本体の埋戻部のブロック積等の施工がほぼ完了しました。(8月末で92%の進捗です。) 7月7日の大雨で法面が一部崩落し、その部分の補修等で工期が9月30日まで延伸となります。9月より崩落部の修繕を開始し、並行して9月第2週頃より、仮設道に使用した土砂の撤去搬出作業(10tDT等)を開始する予定です。大型車が頻繁に走行する際は、交差点部に交通整理員を配置し、最後まで事故のないよう進めて参ります。引き続きご理解と協力をよろしくお願いいたします。

記

**工事名:** 宮ノ谷川砂防工事(堰堤工)  
**工期:** 令和2年12月9日～令和3年8月26日(9月30日まで延伸)  
 今後  
 の  
 予  
 定  
 ・9月第2週頃より、土砂搬出の作業を開始する予定です。  
 ・10t大型の生コン車・ダンプ等が頻繁に通行する際は、集落内に2名～3名  
 交通整理員を配置して安全誘導に心がけます。  
 \*生コン調達の関係で土曜日作業があります。  
 \*天候等により工程等が変更となる場合がありますのでご了承下さい。

**作業時:** 午前8:00～午後5:00  
 \*地元車両が一時的に通行出来ない場合があります。(工事予定看板で掲示します)  
**受注者:** 吉田建設株式会社 (0857-24-9748)  
 担当者: 川上 啓志 携帯 090-5702-1824  
**発注者:** 鳥取県土整備事務所 河川砂防課 砂防担当  
 担当者: 岡田、徳田 電話 0857-20-3642  
 \*お気づきの点がございましたら、現場事務所(児童公園内)の川上まで遠慮なくお伝え下さい。

吉田建設HPで現場のドローン写真をご覧ください。QRコード⇒




管理用道路の仕上げ作業をしています。



崩落した部分の補修用資材の確認をしています。



ドローンでの空撮です(9月2日PM現在)。

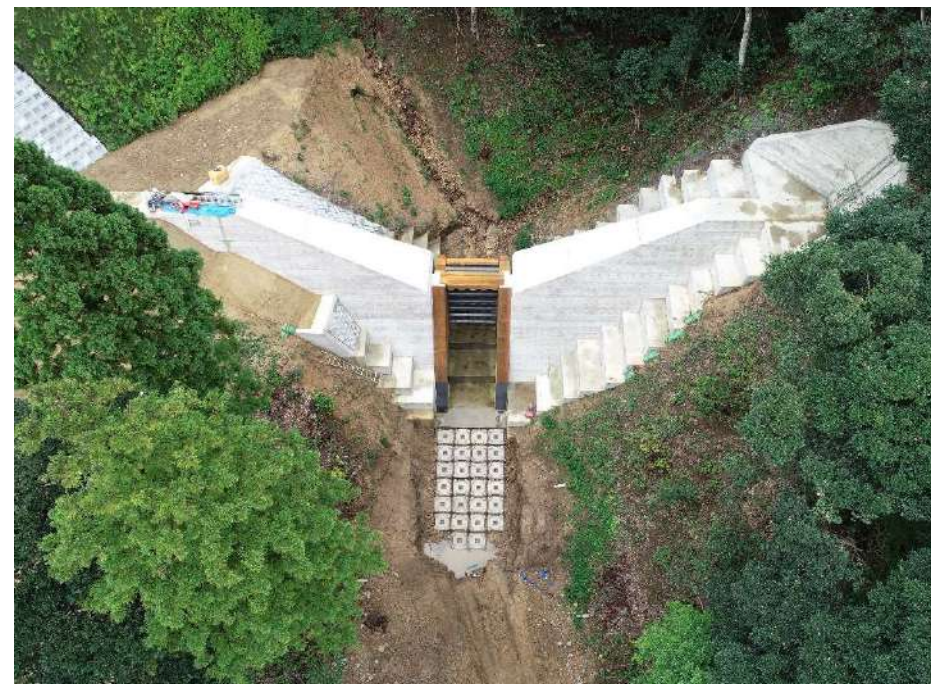

ドローンでの空撮です(9月2日PM現在)。



ドローンでの空撮です(9月2日PM現在)。



ドローンでの空撮です(9月2日PM現在)。
