

三谷地区地域ため池(追作堤)改修工事


追作堤の改修工事は、10月7日より刃金盛土を開始し、20cm毎の転圧仕上げを繰り返し、現在24層目まで施工が完了しております。仕上げの高さより1.5m程度下がったところまで形ができてまいりました。11月の作業は、盛土の仕上げ・斜樋の仕上げをおこない刃金土の前面に、浸食防止用の二次製品を設置する作業と、洪水吐きの準備にとりかかっています。10月の天候が良かったことで、盛り立て作業も順調に進み工程の遅延なく進んでおります。11月の10日過ぎに、工事の施工管理用の航空写真の撮影も予定しております。7月・11月・竣工時の3回実施し現場が変化していく様子を管理いたします。11月に入りますと気温も下がり天候不順の日が増えてくると思いますが、工程管理を確実にこなすとともに、コンクリート等の養生を徹底し良い構造物に仕上がるよう作業員一同力を合わせてがんばってまいります。いましばらく皆様のご協力をよろしくお願いいたします。



工事場所： 鳥取市河原町三谷地内
 工期： 平成 27年 3月 26日 ～ 平成 28年 1月 5日【変更2月15日】

発注者： 鳥取県東部農林事務所 TE10857-20-3571
 連絡先 地域整備課 総合整備担当 FAX 0857-37-1283
 担当者: 日野 浩二(主任監督員) 田中 彰(一般監督員)

施工者： 吉田建設株式会社
 連絡先 住所 鳥取市 国府町 広西 226番地
 TEL 0857-24-9748
 FAX 0857-29-4940
 現場代理人: 川上 啓志 主任技術者: 大谷 経行

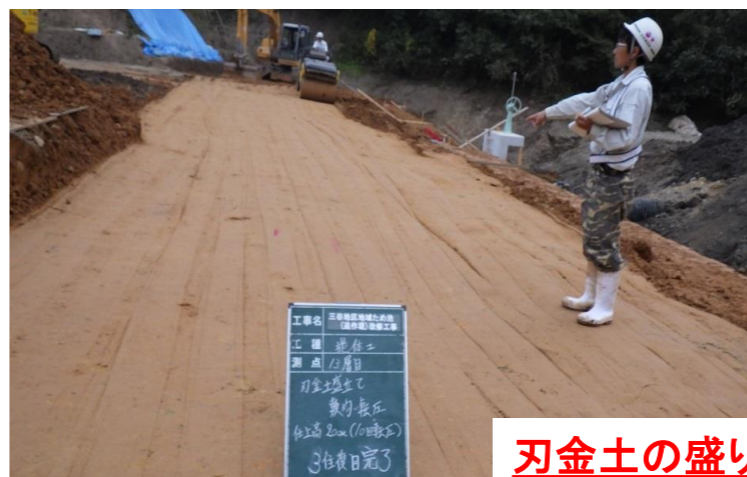

刃金土の盛り立ての様子です。

工事内容

ため池改修 1式 各月の主な作業予定
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

- 1 堤体工
- 2 洪水吐工
- 3 取水施設工
- 4 付帯工
- 5 仮設工


準備工	堤仮体設工	仮付堤設工	取水堤設工	取水堤設工	取水付堤設工	取水付堤設工	洪水吐工	堤体工	洪水吐工	堤体工	後片付け
-----	-------	-------	-------	-------	--------	--------	------	-----	------	-----	------

材料確認しています。

「斜樋管施工状況！」



盛立後の試験をしています。

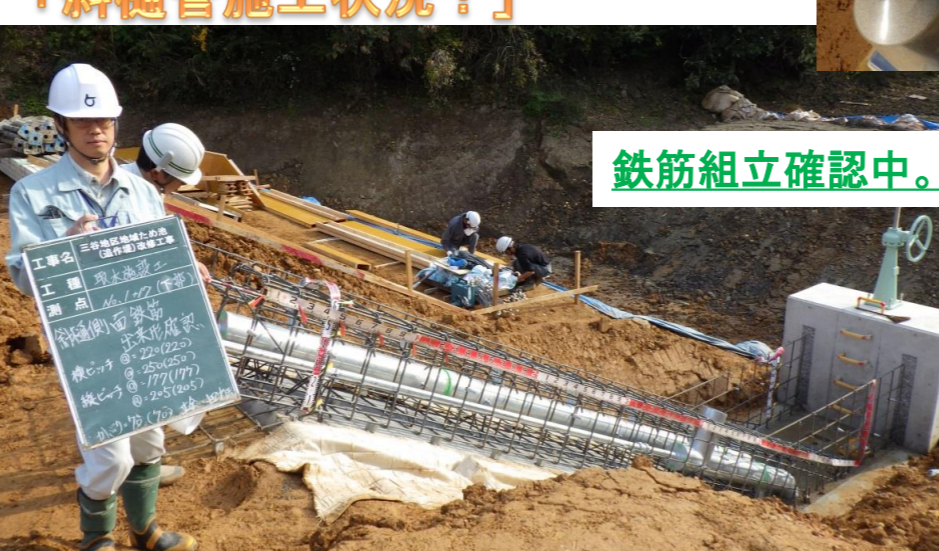

鉄筋組立確認中。



「中間検査の様子」

10月28日に発注者による中間検査がありました。
