

工事についてのお知らせ

三谷地区ため池改修通信 2月号

施工者: 吉田建設(株)

三谷地区地域ため池(追作堤)改修工事

三谷地区の皆様には、日頃よりため池工事へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。本工事本作業を終え、最終の片付け・清掃作業を残すのみとなりました。今年度は、10月～11月前半の天候に恵まれたこと、また、暖冬のおかげで積雪による工事の停滞が少なかったことで工期内の完工が可能となりました。4月当初より、毎月1回発行させていただきました『ため池通信』も、この2月号と最終号を残すのみとなりました。現場が集落から少し離れておりますので、進み具合を皆様に少しでも知っていただくとう始めたこの通信。少しはお役にたてましたでしょうか。今回は、4月からの現場の推移を、定点写真にて紹介させていただきます。様々な懸案事項を三谷地区の田中様/梶川様・発注者の田中様と随時打合せをおこない進めさせていただきました。最後の竣工検査まで、できることを力いっぱいがんばらせていただきます。検査完了まで、無事故・無災害を目指そうと思っておりますので、あと数日間、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事場所： 鳥取市河原町三谷地内
 工期： 平成 27年 3月 26日 ～ 平成28年1月5日【変更2月15日】

発注者： 鳥取県東部農林事務所 TEL 0857-20-3571
 連絡先 地域整備課総合整備担当 FAX 0857-37-1283
 担当者：日野 浩二(主任監督員) 田中 彰(一般監督員)

施工者： 吉田建設株式会社
 連絡先 住所 鳥取市 国府町 広西 226番地
 TEL 0857-24-9748
 FAX 0857-29-4940
 現場代理人:川上 啓志 主任技術者:大谷 経行

工事内容

ため池改修 1式 各月の主な作業予定

- 1 堤体工
- 2 洪水吐工
- 3 取水施設工
- 4 付帯工
- 5 仮設工

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
準備工	堤仮設工	仮付帯工	取水堤体工	取水堤体工	取水付帯工	取水付帯工	洪水吐工	堤体工	洪水吐工	洪水吐工	後片付け



5月末



6月末



7月末



9月頭



10月頭



11月頭



12月頭



12月末

あと一息で終了。最後まで無事故・無災害でがんばります。(月例安全訓練)↓




3月末



4月末



1月末

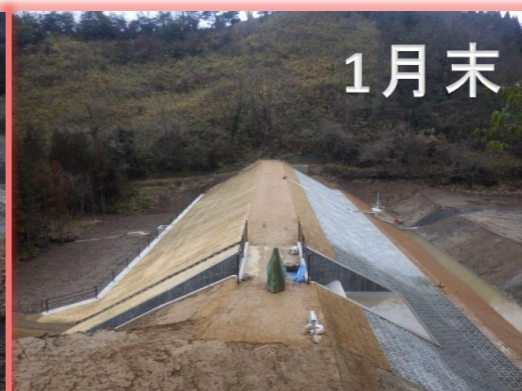

1月末



1月末
